







# CITTÀ DI TORINO

Divisione Infrastrutture e Mobilità Area Infrastrutture

### RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSO MARCONI


#### **BICIPLAN 4 - CONNESSIONE RETE CICLABILE**

Progetto finanziato nell'ambito alla risposta dell'Unione alla Pandemia di COVID - 19 (REACT EU - PON METRO - TO.6.1.2.e)

## **PROGETTO ESECUTIVO**

### **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

CRP Indice di revisione Pata
Rev. 0 Febbraio 2022

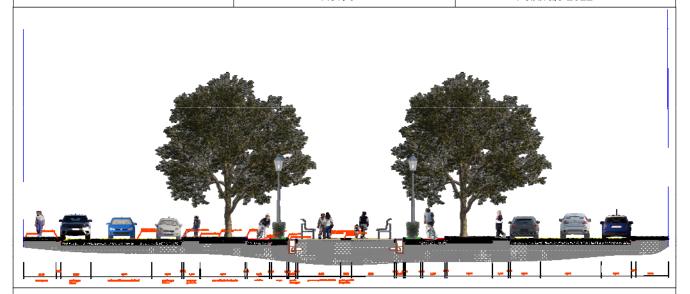

GRUPPO DI LAVORO

Ordine di Servizio del 7 dicembre 2021 prot.21496

Arch. Paola GIORDANO

Progettista coordinatore

Ing. Stefano CIANCHINI

Progettista opere per impianti semaforici

Geom. Luigi PILONE

Collaboratore Tecnico

Arch. Lelia GUGLIELMINOTTI

Collaboratore Mobilità e Segnaletica

Ing. Riccardo MORELLO

Coordinatore Sicurezza Fase Progettazione

nominato con incarico D.D.3740 del 20/08/2021

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Ing. Riccardo MORELLO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giorgio MARENGO

DIRETTORE DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Ing. Roberto BERTASIO

N°	Fasi	Data d'inizio	Data di fine
1	VIA M. CRISTINA - C.SO M. D'AZEC	01/06/2022	07/06/2022
2	Rimozione guide, scavo fondazione	08/06/2022	21/06/2022
3	Scavi vari adeguamenti rete meteo	22/06/2022	12/07/2022
4	SCAVI per Sottofondi stradali e ma	06/07/2022	26/07/2022
5	Fresatura tappeto bituminoso	27/07/2022	09/08/2022
6	Rimozione arredi urbani	03/08/2022	09/08/2022
7	Pavimentazioni banchine alberate d		06/09/2022
8	Realizzazione fascia verde lato inte		20/09/2022
	realizzazione fascia in acciottolato	14/09/2022	27/09/2022
	Pavimentazione vaiale centrale in c		11/10/2022
11	spostamento caditoie esistenti	05/10/2022	25/10/2022
	Fascia in acciottolato canaletta	26/10/2022	16/11/2022
13	Opere di finitura, segaletica orizzon	17/11/2022	07/12/2022
14	Arredo urbano	08/12/2022	21/12/2022
15	realizzazione punto di veduta su co	22/12/2022	05/01/2023
16	L. MARCON-V.M.CRISTINA -NASI D	01/09/2022	14/09/2022
17	Sottofondi stradali e marciapiedi	15/09/2022	28/09/2022
18	Pavimentazioni stradali e piste	29/09/2022	12/10/2022
19	Cordolature, ripristini stradali	13/10/2022	26/10/2022
20	Adeguamento impianti semaforici	27/10/2022	10/11/2022
21	attraversamentii ciclabili	11/11/2022	08/12/2022
22	Raccolta acque meteoriche	02/12/2022	22/12/2022
23	Illuminazione pubblica	23/12/2022	09/01/2023
24	Opere di finitura, segaletica orizzon	10/01/2023	23/01/2023
